

## ENGELSBORG SKIBSVÆRFT

Fr.nr.4420:4

### HISTORIE

På øen Slotø i Nakskov Fjord byggede Kong Hans i 1509 et befæstet orlogsværft bestående af tårn og to flankemure omgivet af to vandfyldte grave og en vold. Endvidere har der have været en del tilhørende bygninger. Lensadministrationen for Lolland flyttes samtidig med opførelsen fra Ravnsborg, hvor også en del af byggematerialet kom fra, til Engelsborg. Orlogsværftet fungerer indtil midten af 1500-tallet. I 1623 istandsatte Christian IV værftet og det fungerede igen frem til 1632. Værftet blev herefter delvist nedbrudt da materialerne skulle bruges til Nykøbing Slot. Engelsborg blev fredet ved en kancellifredning i 1809-11. Den lokale lektor Marius Hansen, Nakskov, udgravede i 1944 – 47 ruinen.

### ADMINISTRATION

Privat eje. Lolland kommune.

### ADGANGSFORHOLD

#### Besøg

Engelsborg besøges årligt af ca. 5.000 gæster.

#### Vejskiltning

Engelsborg er beliggende på en lille ø i Nakskov Fjord.

#### Parkering

Privat bådebro og stranden

#### Information

SNS fortidsmindeskilt.

#### Adgangsveje

Direkte adgang fra stranden. Postbåden og turbåde i Nakskov Fjord lægget til ved den private bro såfremt der er besøgende til Engelsborg.



## PLEJE

### FORMIDLENDE

Ruinarealets centrale del plejet og ligger i græs. Ruinerne fremtræder synlige og let forståelige. Den ydre vold er tilgroet med træer og buske undtagen den nordre del der ligger i græs. Volden bør fremstå uden bevoksning så den visuelt bliver synlig.

### BEVARENDE

Vedplanter fjernes fra det centrale areal med ruinen. Den ydre volds sydlige dels beplantning udtynnes/fjernes så volden kan fremstå med græs og vanderosion derved forhindres.

### ØKONOMI

Udgiften til årlig pleje anslås til	20.000
Bevoksningen på volden fjernes og den udlægges i græs	40.000



## TILSTAND

### Vestre flankemur

#### GUL

Offerlaget nedbrydes, skal sikres.

#### ØKONOMI

2 mand i 1 uger	35.000
-----------------	--------



### Østre flankemur

#### GUL

Offerlaget nedbrydes, skal sikres.

#### ØKONOMI

2 mand i 1 uge	35.000
----------------	--------

### Formidling

Udvidelse af anløbsbroen så en del af broen kan benyttes af sejlede besøgende.



## ØKONOMI

Ny anløbsbro 250.000

## BUDGET I ALT

### Gul

Vestre flankemur: 2 mand i 1 uge 35.000

Østre flankemur: 2 mand i 1 uge 35.000

**I alt 70.000**

### Formidling

Ny anløbsbro 250.000


### Pleje

Almindelig pleje årligt 10.000

Bevoksningen på volden fjernes og den udlægges i græs 40.000

## Besigtiget

22-01-2008 af Jørgen Frandsen

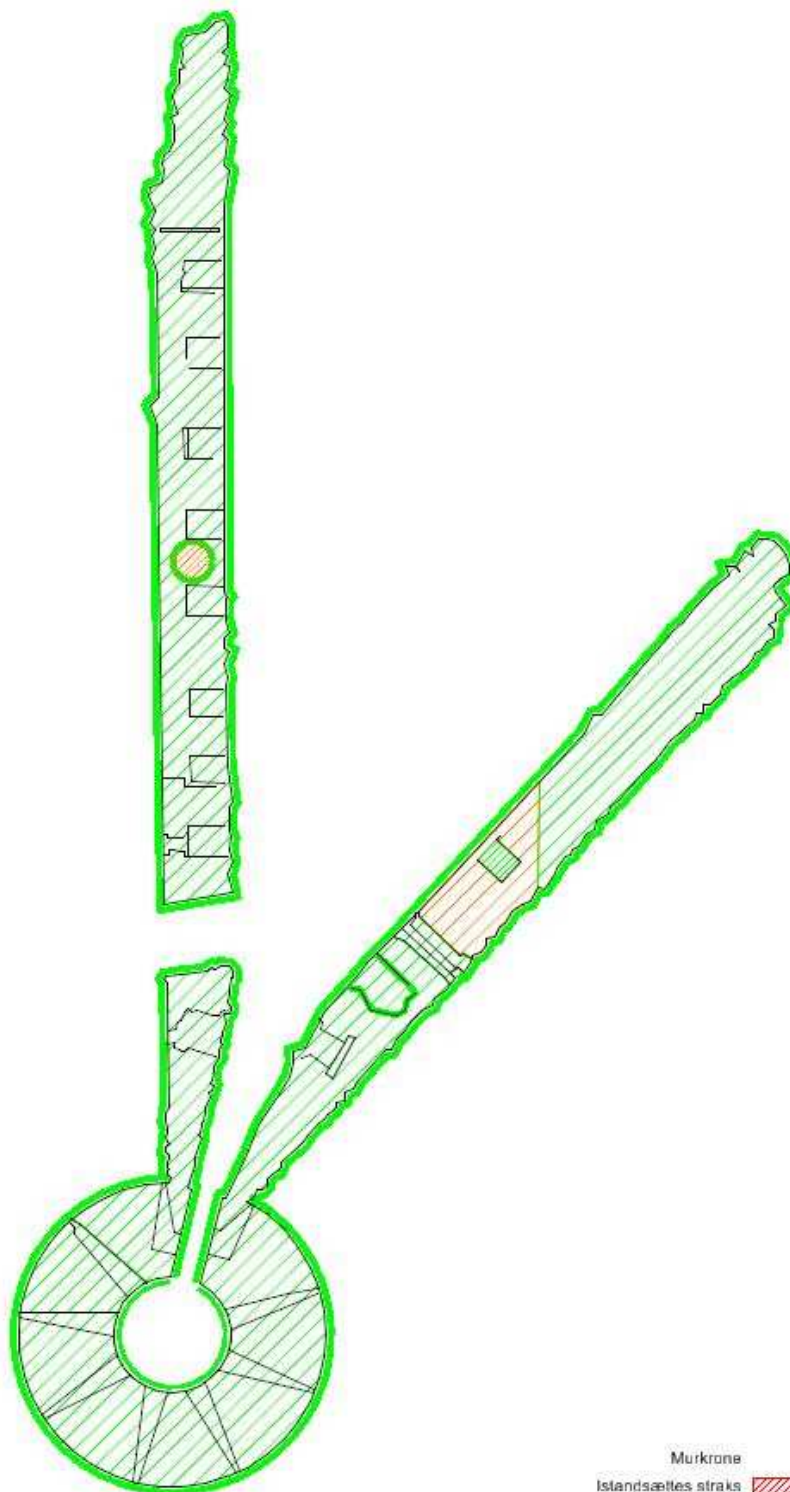

<b>Murkrone</b>		<b>Murflade</b>	
Istandsættes straks		Istandsættes straks	
Istandsættes if. 2-5 år		Istandsættes if. 2-5 år	
God stand		God stand	

# Engelsborg

F. nr: 4420:4

Titel / emne: Oversigtsplan

Projekt: Tilstand 2007

Opmåling, dato (kilde): JFN 22.01.2008

Init: MHM Mål: 1:250 Dato: 2008.02.11



**NATIONALMUSEET**

FORSKNINGS- & FORMIDLINGSAFDELINGEN Danmarks Middelalder og Renaissance DANMARKS RUINER  
 Frederiksholms Kanal 12 DK - 1220 København K Tlf +45 33 47 31 28 Fax +45 33 47 33 12
