

## Tårnborg

Fr.nr. 3621:20

### HISTORIE

Tårnborg er et led i den række af befæstninger, der i midten af 1100-tallet blev opført til beskyttelse af storebæltsoverfarten. Ind til begyndelsen af 1300 årene, hvor byen blev flyttet til det nuværende Korsør, lå den godt beskyttet inde i Korsør nor. Tårnborg lå oprindeligt sammen med kirken, ladegården og Tårnborg by på en halvø, som mod vest, nord og øst var omgivet af Korsør nor og Halseby sø.

### ADMINISTRATION

Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm. Arealerne omkring Tårnborg er med ladegården, en teglovn og Tårnborg bys arkæologiske rester er omfattet af en arealfredning.

### ADGANGSFORHOLD

#### Besøg

Voldstedet ligger ved vejen som passerer mellem voldstedet og kirken.

#### Vejskiltning

Skiltning til Tårnborg kirke

#### Parkering

Parkering til omk. 20 biler på parkeringspladsen som ligger mellem voldstedet og kirken.

#### Information

Fortidsmindeskilt, SNS neden for voldstedet..

#### Adgangsveje

Adgang fra P-plads ad sti over det fredede areal ca. 50 m. Trappen op til borgpladsen er udtjent, men repareret nødtørftigt.

### PLEJE

#### FORMIDLLENDE

Voldstedet gror til i krat, mens arealerne omkring tilsyneladende slås jævnlige med maskine.

#### BEVARENDE

Der gror flere år gamle træer på og umiddelbart op til ruinens mure og i brolægningerne. Disse skal fjernes



Slotsbanken og kirken set fra ladegården



Slotsbanken set fra P-plads



Nedslidt trape til borgpladsen

for at undgå yderligere nedbrydning.

#### ØKONOMI

Engangsudgift til rydning	15.000
Årlig pleje med fjernelse af vedplanter i og omkring ruinerne og nedslåning af nyopvækst på voldstedet	5.000

### TILSTAND

#### Tårnruinen

##### RØD

Tårnfundamentet er delvist opbrudt og sprængt af overgroning.

#### ØKONOMI

2 mand i 4 uger	120.000
-----------------	---------

##### GUL

Resten af murene mangler mørtel og kiler, bør sikres.

#### ØKONOMI

2 mand i 2 uger	60.000
-----------------	--------

#### Ringmuren

##### RØD

En del af sydmuren er væltet ud. Nord- og østmurene, der er bevaret i flere skifters højde, er delvist sprængt af overgroning. Vestmuren, der består af et enkelt skifte, er delvist gået i opløsning med løse sten som ligger ude for murflugten.

#### ØKONOMI

2 mand i 16 uger	480.000
------------------	---------

##### GUL

Resten af murene mangler mørtel og kiler, bør sikres.

#### ØKONOMI

2 mand i 2 uger	60.000
-----------------	--------

#### Bygningsrester og brolægninger

##### GUL

Bygningsfundamenter, hypokaust og brolægninger, der blev frilagte ved udgravningen, er i dag svært erkendelige på grund af overgroning. Eventuel frilægning, tildækning eller markering.



Tårnfundamentet overgroet



Nordre ringmur sprængt



Østre ringmur overgroet og sprængt



ØKONOMI  
2 mand i 6 uger 180.000

### Formidling

Jorden fra udgravningen som danner en bakketunge mod vest bør flyttes til dengamle grusgrav i bankens nordside.

ØKONOMI  
Arkæologisk undersøgelse 20.000  
Flytning af jord 50.000

### Adgang

Der bør etableres en ny trappe

ØKONOMI  
Trappe 20.000

### BUDGET I ALT

#### Rød

Tårn 120.000  
Ringmur 480.000

**I alt 600.000**

#### Gul

Tårn 60.000  
Ringmur 60.000  
Ruiner 180.000

**I alt 300.000**

#### Formidling

Flytning af jord 70.000

#### Adgang

Ny trappe 20.000

#### Pleje


Engangsforanstaltning 15.000  
Almindelig pleje årligt 5.000

#### Besigtiget

29-05-2009 af Kjeld Borch Vesth



Søndre ringmur helt overgroet af krat

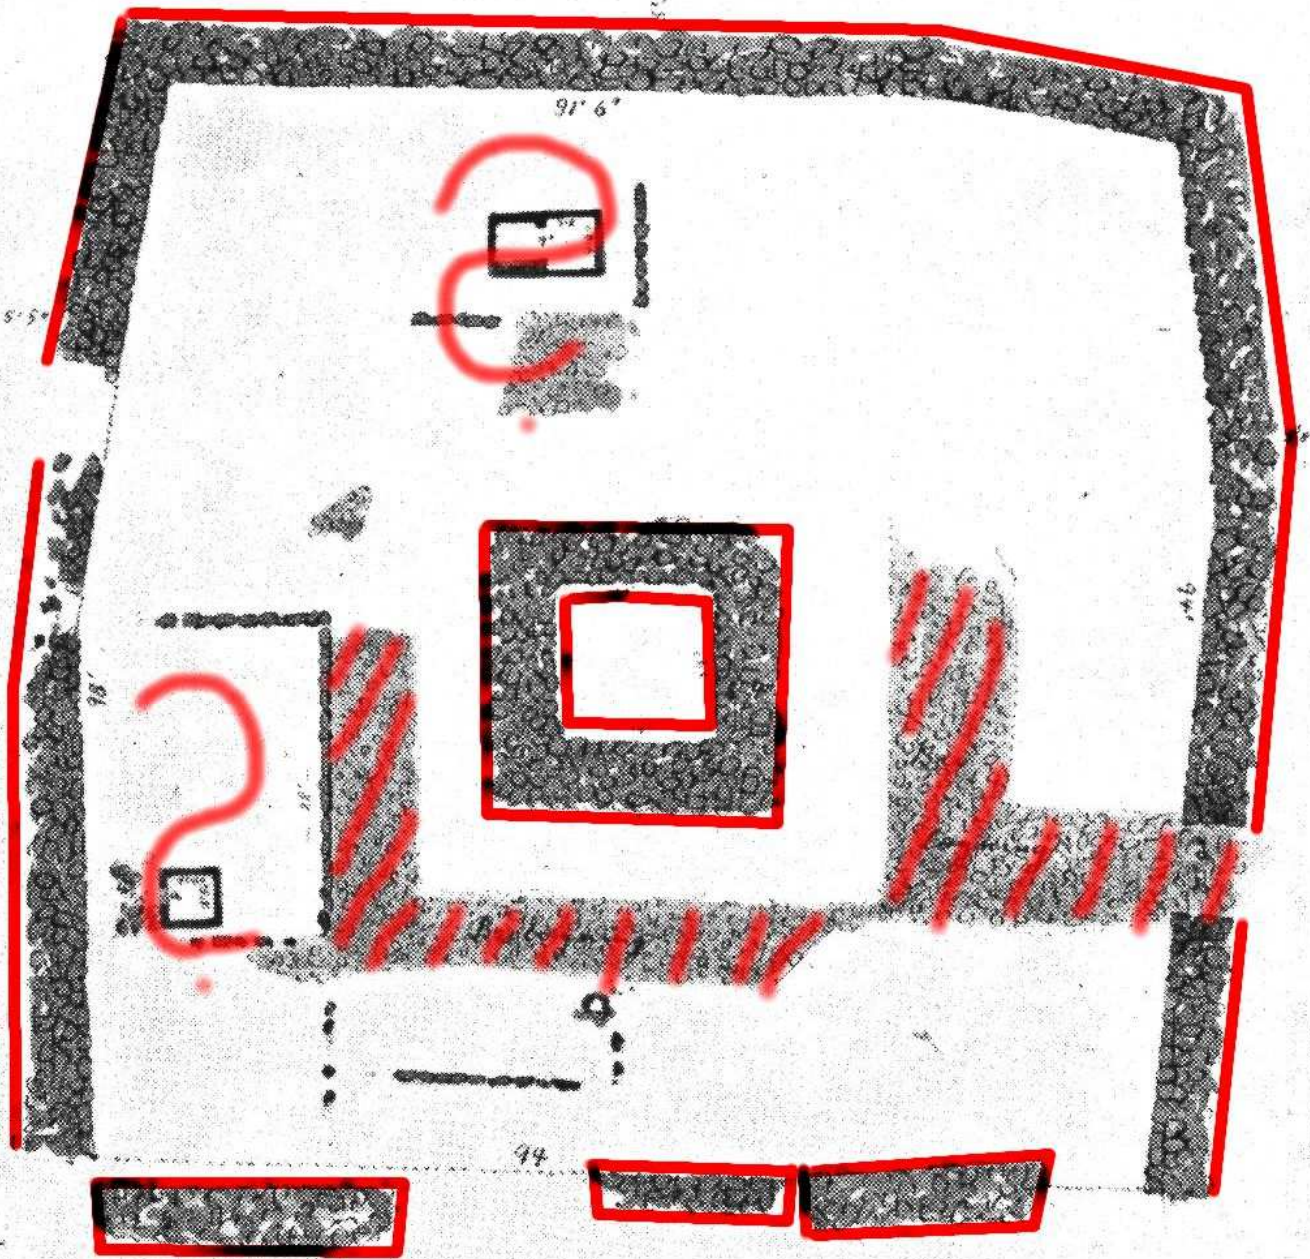

- █ Bør istandsætte
- █ Istandsættes 2-5 år
- █ God vedligeholdelsestilstand
- █ Græstorvsmarkering



Tårnberg
